ISO 9001:2000 - PBQP-H Nível A

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SP - 145

Cliente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.	**Folha No.:** 2
Local: EPTC - DF 001 - DIVERSOS LOCAIS - RECANTO DAS EMAS/DF	
Obra No.: 2269 **Data:** 06/01/15 **Des./Dig.:** Caroline Souza	**Eng.:** Alexandre Resque

Cota: 0,00 m

Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.

Inicial: 23,30m em 16/12/14

Final: 23,29m em 17/12/14

Penetração No. Golpes /30 cm

- - - - 1a.e 2a. Penetrações

——— 2a.e 3a. Penetrações

Gráfico

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes 1°+ 2°	Número de Golpes 2° + 3°	Classificação da camada
	19		7	8	
	20		10	10	
	21		7	8	
	22		5	6	
	23		8	9	
N.A. 23,29	24		10	11	
	25		10	10	Argila arenosa, vermelha, consistência media a rija
	26		10	11	
	27		11	12	
	28		12	13	
	29		17	18	
	30		17	18	
	31	30.00	25	32	Argila arenosa, vermelha, dura
	32	31.00	42	45	
	33		47	50	Areia siltosa, variegada, compacta a muito compacta
	34		51	53	
	35	34.45	56	61	
					LIMITE DE SONDAGEM

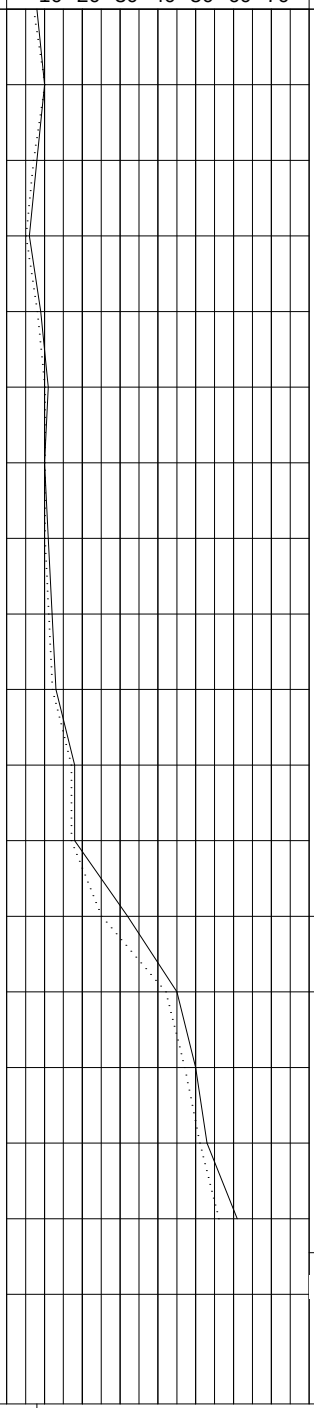

Revestimento Ø Ext.: 3"

Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm / Ø Ext.: = 50,8 mm

Peso:65 kg - Altura de Queda = 75 cm.

O	Amostra não recuperada	O/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes
NFO	N. d'água não foi obs.		
NFE	N. d'água não encontrado	P/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente
ST	Sondagem à trado		

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SIA Trecho 03 Lotes 2005/2015 - Fone/Fax: (61) 3234-2143/3234-9734 - soltec@soltecengenharia.com.br - www.soltecengenharia.com.br
