


gw

ENGENHARIA
DESDE 1978

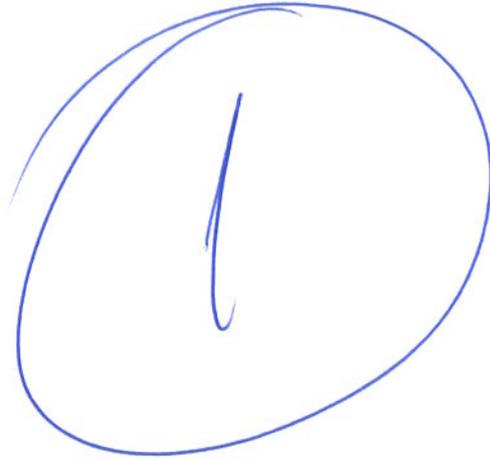

SOLTEC®
ENGENHARIA LTDA

Handwritten blue scribbles and marks at the bottom right corner.



**AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL**

LICITANTE: CONSÓRCIO GW / SOLTEC

CONCORRÊNCIA N° 003/2019

OBJETO: Execução das obras para construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, ciclovias, barreiras de concreto tipo New Jersey, revitalização de pavimento e sinalização horizontal e vertical na DF-047 (EPAR), no trecho compreendido entre as rodovias DF-025 (EPDB) a DF-051 (EPGU).

PROPOSTA COMERCIAL

REF.: CONCORRÊNCIA N° .003/2019 - PROCESSO N° 00113-00027758/2019-45

FOLHA:

001



3.5. PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CONCORRÊNCIA N°.003/2019 - PROCESSO N° 00113-00027758/2019-45

FOLHA:

002



CONSÓRCIO GW / SOLTEC
SCIA QUADRA 11 CONJUNTO "1" LOTES 01 e 12 - BRASÍLIA/DF CEP.:
71.250.510 FONE: (61) 3363-8600 E-MAIL:
planejamento@gwengenharia.com.br



Brasília, 07 de janeiro de 2020

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF

Objeto: Contratação no regime de empreitada por preço unitário, a execução das obras para construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, ciclovias, barreiras de concreto tipo New Jersey, revitalização de pavimento e sinalização horizontal e vertical na DF-047 (EPAR), no trecho compreendido entre as rodovias DF-025 (EPDB) a DF-051 (EPGU).

Ref. : CONCORRÊNCIA nº 003 / 2019 - DER/DF.

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador "K" é de 0,8498 (zero vírgula oito, quatro, nove, oito) a ser aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e serviços.

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o percentual de ISS aplicado é de 2,00 %, portanto o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 243.659,65 (Duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e secenta e cinco centavos).

Encontra-se anexo o cronograma físico-financeiro provisório da obra.

Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador "K" estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador "K" apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo DER-DF neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo V.

	SCIA QUADRA 11 CONJ: 01 LOTES 01 e 12 Brasília/DF Fone: (61) 3363 8600 CEP: 71.250-510 E-mail: planejamento@gwengenharia.com.br	MG/PR
--	--	-------

Nº folhas:

003



CONSÓRCIO GW / SOLTEC
SCIA QUADRA 11 CONJUNTO "1" LOTES 01 e 12 - BRASÍLIA/DF CEP.:
71.250.510 FONE: (61) 3363-8600 E-MAIL:
planejamento@gwengenharia.com.br



Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e serão executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente K por nós proposto.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

O prazo de execução total das obras é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos.


O prazo de validade desta proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos envelopes da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessários a perfeita execução da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Atenciosamente,


GW Const. e Incorp. Ltda
Magda M^a da S. Souza Ribas
Eng^o Civil - CREA nº 15223D/DF

	SCIA QUADRA 11 CONJ: 01 LOTES 01 e 12 Brasília/DF Fone: (61) 3363 8600 CEP: 71.250-510 E-mail: planejamento@gwengenharia.com.br	MG/PR
---	--	-------

Nº folhas: 004



3.5. PROPOSTA DE PREÇOS

RESUMO DO ORÇAMENTO

REF.: CONCORRÊNCIA N°.003/2019 - PROCESSO N° 00113-00027758/2019-45

FOLHA:

005

RESUMO DO ORÇAMENTO

CONCORRÊNCIA nº 003 /2019 - DER-DF.

Brasília, 07 de janeiro de 2020

Objeto: Execução das obras para construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, ciclovias, barreiras de concreto tipo New Jersey, revitalização de pavimento e sinalização horizontal e vertical na DF-047 (EPAR), no trecho compreendido entre as rodovias DF-025 (EPDB) a DF-051 (EPGU).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	CANTEIRO	R\$ 134.124,42
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 846.888,97
3	SOLUÇÃO PARA SOLO MOLE	R\$ 5.326.749,43
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 266.885,89
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.245.124,67
6	DRENAGEM	R\$ 363.911,89
7	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 68.384,13
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 304.548,60
9	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 908.450,03
10	AMBIENTAL	R\$ 717.914,71
		R\$ 12.182.982,74
K	0,8498	



3.5. PROPOSTA DE PREÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA N° .003/2019 - PROCESSO N° 00113-00027758/2019-45

FOLHA:

007

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSÓRCIO GW / SOLTEC
 SCIA QUADRA 11 CONJUNTO "1" LOTES 01 e 12 - BRASÍLIA/DF CEP.: 71.250.510
 FONE: (61) 3363-8600 E-MAIL: planejamento@gwengenharia.com.br



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
 Execução das obras para construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, cicloviárias, barreiras de concreto tipo New Jersey, revitalização de pavimento e sinalização horizontal e vertical na DF-047 (EPAR), no trecho compreendido entre as rodovias DF-025 (EPOB) e DF-051 (EPGU).

CONCORRÊNCIA 003/2019 - DER/DF
 DATA: 07/01/2020

RS 12.182.982,74

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	
1	CANTEIRO	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$	134.124,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.124,42
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%	14,00%	16,00%	18,00%	20,00%	22,00%	24,00%	26,00%	28,00%	30,00%	32,00%	34,00%	36,00%
		R\$	59.282,23	118.564,46	177.846,69	237.128,92	296.411,15	355.693,38	414.975,61	474.257,84	533.540,07	592.822,30	652.104,53	711.386,76	770.668,99	829.951,22	889.233,45	948.515,68	1.007.797,91	1.067.080,14
3	SOLUÇÃO PARA SOLO MOLE	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		R\$	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94	532.674,94
4	TERRAPLENAGEM	%	-	8,00%	13,00%	17,00%	21,00%	25,00%	29,00%	33,00%	37,00%	41,00%	45,00%	49,00%	53,00%	57,00%	61,00%	65,00%	69,00%	73,00%
		R\$	-	21.350,87	52.026,31	82.701,75	113.377,19	144.052,63	174.728,07	205.403,51	236.078,95	266.754,39	297.429,83	328.105,27	358.780,71	389.456,15	420.131,59	450.807,03	481.482,47	512.157,91
5	PAVIMENTAÇÃO	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DRENAGEM	%	-	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
		R\$	-	36.391,19	72.782,38	109.173,57	145.564,76	181.955,95	218.347,14	254.738,33	291.129,52	327.520,71	363.911,90	400.303,09	436.694,28	473.085,47	509.476,66	545.867,85	582.259,04	618.650,23
7	MURO DE CONTENÇÃO	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SINALIZAÇÃO	%	-	10,257,62	18.676,83	20.515,24	18.676,83	10.257,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R\$	-	10.257,62	18.676,83	20.515,24	18.676,83	10.257,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	OBRAS COMPLEMENTARES	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	AMBIENTAL	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% Mensal		5,96%	5,35%	5,46%	6,54%	6,49%	6,55%	6,01%	5,93%	7,72%	4,34%	5,67%	5,67%	5,97%	4,79%	3,24%	4,81%	6,05%	3,44%
	Total R\$ Mensal		726.081,59	851.487,96	665.582,60	797.151,60	790.313,19	797.569,41	732.725,01	722.049,58	940.027,05	529.113,15	691.369,38	691.369,38	727.760,57	583.699,93	394.481,82	585.722,72	737.477,44	419.000,35
	% ACUMULADA		5,96%	11,31%	16,77%	23,31%	29,80%	36,35%	42,36%	48,29%	56,00%	60,35%	66,02%	71,70%	77,67%	82,66%	85,70%	90,51%	96,56%	100,00%
	Total R\$ Acumulado		726.081,59	1.377.569,55	2.043.152,15	2.840.303,75	3.630.616,93	4.428.186,35	5.160.911,36	5.882.960,93	6.822.987,99	7.352.101,14	8.043.470,52	8.734.839,90	9.462.600,48	10.046.300,41	10.440.782,23	11.026.504,95	11.763.982,39	12.182.982,74

Magda M. da S. Souza Ribas
 GW Const. e Incorp. Ltda
 Magda M. da S. Souza Ribas
 Eng.º Civil - CREA nº 15223D/DF

800



TERMO DE ENCERRAMENTO

REF.: CONCORRÊNCIA N°.003/2019 - PROCESSO N° 00113-00027758/2019-45

FOLHA:

009

Brasília, 07 de janeiro de 2020

**AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL – DER/DF**

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente caderno é composto de 10 (dez) páginas, inclusive esta.

Atenciosamente;


GW Const. e Incorp. Ltda
Magda M^a da S. Souza Ribas
Eng^o Civil - CREA nº 15223D/DF


010 
