



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

**CONCORRÊNCIA 002/2018 – DER/DF**

PROPOSTA DE PREÇOS

**DF-001 (EPCT) – IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO
DA RODOVIA. TRECHO: DF-430 ATÉ A ENTRADA
MORADA DOS PÁSSAROS.**

Brasília, 28 de setembro de 2018.

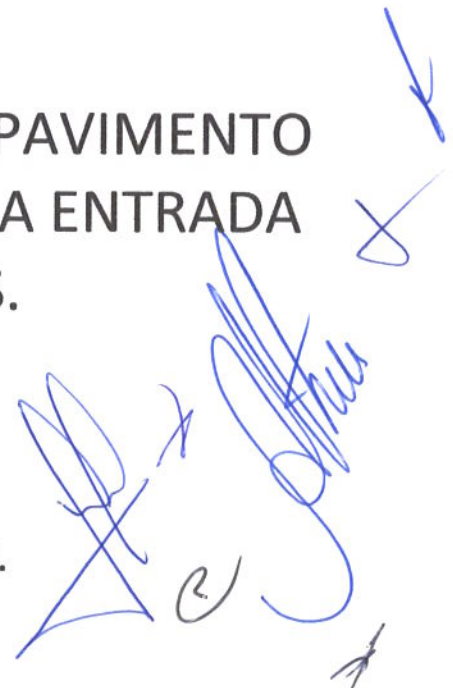

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF.

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA DISTRITAL DF-001 (EPCT), NO TRECHO COMPREENDIDO DO ENTRONCAMENTO DA DF-430 ATÉ O ENTRONCAMENTO COM O NÚCLEO RURAL MORADA DOS PÁSSAROS, COM EXTENSÃO APROXIMADA EM PISTA SIMPLES DE 8.250,00 M, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E CONDICIONANTES AMBIENTAIS.

REF. : CONCORRÊNCIA Nº 002/2018

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS E SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA SUA PREPARAÇÃO.

DECLARAMOS CONCORDAR COM OS TERMOS DO EDITAL REFERENTE A ESTA LICITAÇÃO E QUE ESTA EMPRESA ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO DER-DF QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DOS LICITANTES QUE HAJAM ATENDIDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E DEMONSTREM INTEGRAL POSSIBILIDADE DE EXECUTAREM AS OBRAS PREVISTAS.

O NOSSO COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" É DE 0,6890 (ZERO VÍRGULA SEIS OITO NOVE ZERO) A SER APLICADO SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DOS ORÇAMENTOS DO ANEXO V DO EDITAL, PARA MATERIAIS APLICADOS E SERVIÇOS.

PARA ATENDER O DISPOSTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO 14.122 DE 19 DE AGOSTO DE 1992, O VALOR ESTIMADO DO ISS COMPREENDIDO NO PREÇO PROPOSTO É DE R\$ 144.559,87 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR PROPOSTO.

ENCONTRA-SE ANEXO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROVISÓRIO DA OBRA.

DECLARAMOS QUE EM NOSSO PREÇO OBTIDO COM O COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DAS OBRAS, INCLUSIVE AS DESPESAS COM MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA OU NÃO, EVENTUAL ELABORAÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS, SEGUROS EM GERAL, EQUIPAMENTOS AUXILIARES, FERRAMENTAS, ENCARGOS DA LEGISLAÇÃO SOCIAL TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA, DA INFORTUNÍSTICA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR QUAISQUER DANOS CAUSADOS A TERCEIROS OU DISPÊNDIOS RESULTANTES DE IMPOSTOS, TAXAS, REGULAMENTOS E POSTURAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, ENFIM, TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO TOTAL E COMPLETA DAS OBRAS CIVIS E DAS OBRAS COMPLEMENTARES, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, SEM QUE NOS CAIBA, EM QUALQUER CASO, DIREITO REGRESSIVO EM RELAÇÃO AO DER-DF.

COMPROMETEMO-NOS A EXECUTAR EVENTUAIS SERVIÇOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NÃO CONSTANTES DO EDITAL, MAS INERENTES À NATUREZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ESTES SERVIÇOS/MATERIAIS TERÃO SEUS CUSTOS UNITÁRIOS DETERMINADOS PELO USO OBRIGATÓRIO DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO DER-DF. PARA SERVIÇOS NÃO CONSTANTES DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO DER-DF,

ng Engenharia



OS CUSTOS UNITÁRIOS SERÃO ESPECIFICADOS E ORÇADOS PELO DER-DF E SERÃO EXECUTADOS E PAGOS DE ACORDO COM O SERVIÇO/MATERIAL EFETIVAMENTE EXECUTADO/FORNECIDO, COM APLICAÇÃO DO COEFICIENTE K POR NÓS PROPOSTO.

DECLARAMOS QUE NOS SUJEITAMOS ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL E QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS.

O PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS E O MONITORAMENTO AMBIENTAL OCORRERÁ POR 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CORRIDOS.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

ACOMPANHAM A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS OS DOCUMENTOS PREVISTOS NESTE EDITAL, BEM COMO TODOS OS DEMAIS JULGADOS OPORTUNOS PARA PERFEITA COMPREENSÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA.

UTILIZAREMOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DA OBRA E A EQUIPE TÉCNICA/ADMINISTRATIVA QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COMPROMETENDO-NOS, DESDE JÁ, A SUBSTITUIR OU AUMENTAR A QUANTIDADE DOS EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL, DESDE QUE ASSIM O EXIJA A FISCALIZAÇÃO DO DER-DF.

NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVAREMOS RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS OU QUALQUER OUTRA NORMA QUE GARANTA A QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, BEM COMO AS RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO DER-DF, ASSUMINDO, DESDE JÁ, A INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA PERFEITA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS MENCIONADAS.

REGISTRAMOS AINDA, QUE O COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" APRESENTADO POR ESTA EMPRESA, NESTA LICITAÇÃO, CONTEMPLA O PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE QUALQUER NATUREZA, COM SUAS RESPECTIVAS ALÍQUOTAS DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E O DESCONTO APRESENTADO SOBRE O VALOR ORÇADO PELO DER-DF NESTE PROCESSO LICITATÓRIO, INCIDIRÁ SOBRE OS DEMAIS ITENS DE OBRAS, MATERIAIS OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS PLANILHAS DO ANEXO V.

André Vieira de Azevedo - DF, 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Engenheiro Civil
CREA/MG 112441/D

NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.326.648/0001-03

LUCIANO NEVES GARCIA

CPF 829.768.561-68 - SÓCIO PROPRIETÁRIO

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 20.103.987/0001-87

ATHUS RODRIGUES DE SOUZA

CPF 991.017.181-34 - SÓCIO PROPRIETÁRIO

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Marcos Bocchat Lopes de Souza - RT
Engº Civil - CREA 139905/D-RJ

Descrição Implantação do Pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT)

Trecho DF-430 até Entrada Morada dos Pássaros

Extensão 8,250 km

Prazo da obra 720 dias

Valores expressos em Reais (R\$)

Data da Proposta: 28/09/2018

Data base: 01/11/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Item do Cronograma	Custo (R\$)	Percent.(%)	30		60		90		120		150		180	
			Percent.(%)	Valor (R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	81.681,32	0,57%	100,00%	81.681,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	775.494,47	5,36%	0,60%	4.652,97	10,80%	83.753,40	39,38%	305.389,72	18,78%	145.637,86	25,71%	199.379,63	4,73%	36.680,89
TERRAPLENAGEM (Rodovia)	1.333.512,38	9,22%	25,00%	333.378,10	25,00%	333.378,10	25,00%	333.378,10	25,00%	333.378,10	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO (Rodovia)	6.039.821,47	41,78%	-	-	25,00%	1.509.955,37	25,00%	1.509.955,37	25,00%	1.509.955,37	25,00%	1.509.955,37	-	-
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Rodovia)	2.960.898,98	20,48%	-	-	25,00%	740.224,75	25,00%	740.224,75	25,00%	740.224,75	25,00%	740.224,75	-	-
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (Rodovia)	298.371,27	2,06%	-	-	20,00%	59.674,25	20,00%	59.674,25	20,00%	59.674,25	20,00%	59.674,25	20,00%	59.674,25
SINALIZAÇÃO (Rodovia)	338.931,25	2,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00%	254.198,44	25,00%	84.732,81
OBRAS COMPLEMENTARES	448.535,80	3,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00%	336.401,85	25,00%	112.133,95
MEIO AMBIENTE (Passagem de fauna)	281.392,17	1,95%	-	-	75,00%	211.044,13	25,00%	70.348,04	-	-	-	-	-	-
MEIO AMBIENTE (Paisagismo e Área de Degradação)	1.599.785,32	11,07%	-	-	40,00%	639.914,13	40,00%	639.914,13	-	-	20,00%	319.957,06	-	-
MONITORAMENTO REPLANTIO 1º ANO (20%)	198.368,88	1,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONITORAMENTO REPLANTIO 2º ANO (10%)	99.194,05	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolso Mensal	14.455.987,36	100,00%	2,90%	419.712,38	24,75%	3.577.944,12	25,31%	3.658.884,35	19,29%	2.788.870,32	23,66%	3.419.791,35	2,03%	293.221,90
Desembolso Acumulado			2,90%	419.712,38	27,65%	3.997.656,50	52,96%	7.656.540,86	72,26%	10.445.411,18	95,91%	13.865.202,53	97,94%	14.158.424,43

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Athus Rodrigues de Souza
Sócio Diretor

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Marcos Bocchat Lopes de Souza - RT
Engº Civil - CREA 139905/D-RJ

André Vieira P. Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 112441/D

Descrição Implantação do Pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT);

Trecho DF-430 até Entrada Morada dos Pássaros

Extensão 8,250 km

Prazo da obra 720 dias

Valores expressos em Reais (R\$)

Data da Proposta: 28/09/2018

Data base: 01/11/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Item do Cronograma	Custo (R\$)	Percent.(%)	210		240		270		300		330		360	
			Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	81.681,32	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	775.494,47	5,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRAPLENAGEM (Rodovia)	1.333.512,38	9,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO (Rodovia)	6.039.821,47	41,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Rodovia)	2.960.898,98	20,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (Rodovia)	298.371,27	2,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINALIZAÇÃO (Rodovia)	338.931,25	2,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARES	448.535,80	3,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEIO AMBIENTE (Passagem de fauna)	281.392,17	1,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEIO AMBIENTE (Paisagismo e Área de Degradação)	1.599.785,32	11,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONITORAMENTO REPLANTIO 1º ANO (20%)	198.368,88	1,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	198.368,88
MONITORAMENTO REPLANTIO 2º ANO (10%)	99.194,05	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolso Mensal	14.455.987,36	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,37%	198.368,88
Desembolso Acumulado			97,94%	14.158.424,43	97,94%	14.158.424,43	97,94%	14.158.424,43	97,94%	14.158.424,43	97,94%	14.158.424,43	99,31%	14.356.793,31

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Athus Rodrigues de Souza
Sócio Diretor

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Marcos Beechat Lopes de Souza - RT
Engº Civil - CREA 139905/D-RJ

André Vieira P. Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 112441/D

000

Descrição Implantação do Pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT);

Trecho DF-430 até Entrada Morada dos Pássaros

Extensão 8,250 km

Prazo da obra 720 dias

Valores expressos em Reais (R\$)

Data da Proposta: 28/09/2018

Data base: 01/11/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Item do Cronograma	Custo (R\$)	Percent.(%)	390		420		450		480		510		540	
			Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	81.681,32	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	775.494,47	5,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRAPLENAGEM (Rodovia)	1.333.512,38	9,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO (Rodovia)	6.039.821,47	41,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Rodovia)	2.960.898,98	20,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (Rodovia)	298.371,27	2,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINALIZAÇÃO (Rodovia)	338.931,25	2,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARES	448.535,80	3,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEIO AMBIENTE (Passagem de fauna)	281.392,17	1,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEIO AMBIENTE (Paisagismo e Área de Degradação)	1.599.785,32	11,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONITORAMENTO REPLANTIO 1º ANO (20%)	198.368,88	1,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONITORAMENTO REPLANTIO 2º ANO (10%)	99.194,05	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolso Mensal	14.455.987,36	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Desembolso Acumulado			99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Athus Rodrigues de Souza
Sócio Diretor

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Marcos Bocchal Lopes de Souza - RT
Engº Civil - CREA 139905/D-RJ

André Vieira P. Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 112441/D

Descrição Implantação do Pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT);

Trecho DF-430 até Entrada Morada dos Pássaros

Extensão 8,250 km

Prazo da obra 720 dias

Valores expressos em Reais (R\$)

Data da Proposta: 28/09/2018

Data base: 01/11/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Item do Cronograma	Custo (R\$)	Percent.(%)	570		600		630		660		690		720	
			Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	81.681,32	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	775.494,47	5,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRAPLENAGEM (Rodovia)	1.333.512,38	9,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO (Rodovia)	6.039.821,47	41,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Rodovia)	2.960.898,98	20,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (Rodovia)	298.371,27	2,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINALIZAÇÃO (Rodovia)	338.931,25	2,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARES	448.535,80	3,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEIO AMBIENTE (Passagem de fauna)	281.392,17	1,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEIO AMBIENTE (Paisagismo e Área de Degradação)	1.599.785,32	11,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONITORAMENTO REPLANTIO 1º ANO (20%)	198.368,88	1,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONITORAMENTO REPLANTIO 2º ANO (10%)	99.194,05	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	99.194,05
Desembolso Mensal	14.455.987,36	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,69%	99.194,05
Desembolso Acumulado			99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	99,31%	14.356.793,31	100,00%	14.455.987,36

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 Afonso Rodrigues de Souza
 Sócio Diretor

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 Marcos Boechat Lopes de Souza - RT
 Engº Civil - CREA 139905/D-RJ

André Vieira P. Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA/MG 112441/D

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF

REF. CONCORRÊNCIA Nº 002 / 2018

DECLARAMOS, PARA EFEITO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, JUNTO AO DER, E EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE DISPONIBILIZAREMOS OS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO:

TIPO	MARCA	MODELO	FAB.	COND. USO	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS					
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
Caminhão basculante 14 m³ / 323 kW	FORD	2428e	2008	Boa	5	15	15	15	10	1
Caminhão tanque 6.000 l	VOLVO	VM 260	2011	Boa	1	3	3	3	2	0
Rolo compactador pé de carneiro 82 kW / 11,6 t	MULLER	VAP 70	2014	Boa	2	4	4	4	3	0
Motoniveladora 93 kW	CAT	120H	2004	Boa	1	3	3	3	2	0
Rolo compactador de pneus 85 kW / 27 t	DYNAPAC	CP271	2004	Boa	0	3	3	3	3	0
Carregadeira de pneus 3,3 m³ / 213 kW	NEW HOL.	W170	2009	Boa	1	1	1	1	0	0
Trator de esteira com lâmina 259 kW	CAT	D6	1990	Boa	1	1	1	1	0	0
Vibroacabadora de asfalto sobre esteira 82 kW	CIBER	SA14	1999	Boa	0	1	1	1	1	0
Rolo compactador liso 97 kW / 11 t	CAT	CB 534D	2007	Boa	0	2	2	2	2	0
Escavadeira hidráulica com caçamba 1,5m³ / 110 kW	VOLVO	EC 210	2009	Boa	2	3	3	3	2	1
Caminhão distribuidor de asfalto 150 kW	FORD	1317e	2008	Boa	0	1	1	1	1	0
Distribuidor de agregado autopropelido 130 kW	CIFALI	SD1	2002	Boa	0	1	1	1	1	0
Retro-escavadeira de pneus 58 kW	CAT	416E	2011	Boa	0	1	1	1	1	1
Tanque de estocagem de asfalto 30.000 l	-	-	-	Boa	0	1	1	1	1	0
Caminhão carroceria 5 t / 115 kW	M. BENZ	1620	2008	Boa	0	3	3	0	2	0
Trator de esteiras com lâmina 112 kW	CAT	D4	1986	Boa	1	1	1	1	0	0
Trator agrícola 77 kW	NEW HOL.	TL75E	2012	Boa	1	3	3	3	3	0

DECLARAMOS AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS MESMOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE NOS COMPROMETEMOS A SUBSTITUIR E/OU AUMENTAR A QUANTIDADE E O TIPO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO, A FIM DE DAR PLENO ANDAMENTO ÀS OBRAS EM QUESTÃO.

BRASÍLIA - DF, 28 DE SETEMBRO DE 2018.

André Vieira P. Rocha

Engenheiro Civil

CREA/IMG.112441/D

NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LUCIANO NEVES GARCIA

CPF 829.768.561-68 - SÓCIO PROPRIETÁRIO

Athys R. de Souza

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI

ATHYS RODRIGUES DE SOUZA

CPF 991.017.181-34 - SÓCIO PROPRIETÁRIO

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Marcos Bocchat Lopes de Souza - RT
Eng. Civil - CREA 139905/D-RJ

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF – DER/DF

REF. CONCORRÊNCIA Nº 002 / 2018

DECLARAMOS, PARA EFEITO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, JUNTO AO DER, E EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE DISPONIBILIZAREMOS A MÃO DE OBRA ABAIXO RELACIONADOS, NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO:

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PADRÃO SALARIAL	QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA					
		30	60	90	120	150	180
		DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
Auxiliar Administrativo (Almoxarife)	1,9084	1	1	1	1	1	1
Auxiliar Técnico	1,8628	1	1	1	1	1	1
Engenheiro Supervisor	10,6095	1	1	1	1	1	1
Arqueólogo	5,2761	1	1	1	1	1	1
Biólogo	5,2761	1	1	1	1	1	1
Engenheiro ambiental	4,5985	1	1	1	1	1	1
Engenheiro Florestal	7,3276	1	1	1	1	1	1
Geólogo	7,4745	1	1	1	1	1	1
Técnico Ambiental	3,4291	1	1	1	1	1	1
Encarregado de terraplenagem	3,5473	1	1	1	1	1	1
Encarregado de Pavimentação	3,5473	1	1	1	1	1	1
Auxiliar de Topografia	1,5557	3	3	3	3	3	3
Topógrafo	2,3454	1	1	1	1	1	1
Técnico em Segurança do Trabalho	2,6537	1	1	1	1	1	1
Apontador	2,0133	2	2	2	2	2	2
Encarregado de turma	2,2328	2	2	2	2	2	2
Auxiliar de Laboratório	1,6161	4	4	4	4	4	4
Laboratorista	2,5754	2	2	2	2	2	2
Armador	1,6590		3	1	1	1	1
Carpinteiro	1,6590		2	1	1	1	1
Motorista de Caminhão	1,6590	6	22	22	19	15	1
Operador de Equipamentos	1,6590	9	25	25	25	19	2
Pedreiro	1,6590		2	1	1	1	1
Rasteleiro	1,6590		3	3	3	3	
Servente	1,0760	3	72	57	23	34	8

DECLARAMOS AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS MESMOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE NOS COMPROMETEMOS A SUBSTITUIR E/OU AUMENTAR A QUANTIDADE E O TIPO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO, A FIM DE DAR PLENO ANDAMENTO ÀS OBRAS EM QUESTÃO.

André Vieira P. Rocha

Engenheiro Civil - Brasília - DF, 28 DE SETEMBRO DE 2018.
CREAMG 112441/D

NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
LUCIANO NEVES GARCIA
CPF 829.768.561-68 - SÓCIO PROPRIETÁRIO

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI

ATHUS RODRIGUES DE SOUZA
CPF 991.017.181-34 - SÓCIO PROPRIETÁRIO

SIGMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Marcos Boechat Lopes de Souza - RT
Engº Civil - CREA 139905/D-RJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

010

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO DISTRITO FEDERAL

5º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS

PROTESTOS DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DO GUARÁ/DF

CNPJ: 15.664.341/0001-39

TITULAR: EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO CONTROLE Nº: 194325

QE 02 LOTE "N" ÁREA ESPECIAL GUARÁ I - DF - CEP: 71.010-003

FONE: (61) 3552-0005 - 3568-3200

LIVRO Nº 0305-P

FOLHA Nº: 120

PROCURAÇÃO bastante que faz **NG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (**24/07/2018**) nesta cidade do GUARÁ-DISTRITO FEDERAL, em Cartório, perante mim, escrevente, compareceu como outorgante **NG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à QS 09, Rua 120, Lote 20, Sala 03, Águas Claras, Brasília, DF inscrita no C.N.P.J. sob o número 04.326.648/0001-03 representada neste ato pelo sócio **LUCIANO NEVES GARCIA**, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH nº 01516357655 DETRAN/GO, na qual consta CI nº 3230574/SSP/GO e inscrito no CPF/MF nº 829.768.561-68, residente e domiciliado na Rodovia DF 250, Km 2,5, Condomínio Bela Vista, Módulo H, Casa 12 - Sobradinho, Brasília, DF, identificada como a própria, apenas pelos originais e seus respectivos documentos de identidade ora exibidos, cujas cópias ficam arquivadas, sendo juridicamente capaz(es), do que dou fé. Por ela me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador **ANDRE VIEIRA PACHECO ROCHA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº MG 13.622.458 SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 062.882.926-48, residente e domiciliado na Rua Ipê Amarelo, Lote 02, Residencial Castanheiras, Bloco B, Aptº 1103 - Águas Claras, Brasília, DF, *(os dados do procurador foram fornecidos por declaração do outorgante ficando o mesmo responsável por qualquer incorreção)* a quem confere poderes para representar a empresa, em **Licitações públicas em qualquer modalidade, seja Concorrência, Regime Diferenciado de Contratações (RDC), Tomada de Preços, Carta Convite, Pregão Presencial ou Eletrônico, perante a Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, nos âmbitos Federal, Estadual ou Municipal, incluindo Autarquias, NOVACAP-DF, TERRACAP-DF, CODHAB-DF, SEDICT-DF, CAESB-DF, DER-DF, AGETOP, DNIT, CREA**, Administrações Regionais, bem como em qualquer outro órgão e Prefeitura Municipal estabelecida em território nacional e onde mais com esta se apresentar, podendo para tanto, representar a outorgante em sessões públicas de licitação, assinar e rubricar documentos de habilitação, inclusive termo de compromisso de constituição de consórcio, assinar propostas técnicas e de preços, incluindo planilhas de preços, composições de preços, de BDI e de encargos sociais, cronogramas e afins, autorizar e/ou realizar visitas técnicas, prestar ou pedir esclarecimentos, realizar questionamentos, requerer diligências e demais providências necessárias, apresentar impugnações a editais, documentos e propostas, defender os interesses da outorgante em qualquer instância administrativa, opinar sobre assuntos tratados em sessões, renunciar a prazos recursais, assinar documentos e atas, fazer constar em ata os requerimentos que entender necessários, retirar editais, convir com cláusulas e condições, formular ofertas, oferecer lances e vantagens em licitações presenciais ou eletrônicas, concordar ou não com o que julgar conveniente, interpor recursos ou desistir dos mesmos, assinar recursos, depositar e retirar caucões junto aos bancos credenciados, assinar documentação, cadastros, requerer atestado de capacidade técnica, certidões de acervo técnico, termo de recebimento definitivo e provisório, a tudo assistindo e assinando, e praticar qualquer outro ato necessário ao bom e fiel cumprimento deste mandato. **Vedado o subestabelecimento. A presente tem a validade até 31/12/2019. (feita sob minuta).** A parte outorgante declara haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade, civil e criminal, por eventual erro ou inexistência dos mesmos. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento, que lhe li, aceitou e assina. Fica aqui arquivada a guia de recolhimento nº 00064367 paga no valor de R\$38,35, Outorgantes Excedentes R\$0,00, Correios R\$0,00, Autenticação R\$0,00. Eu, (a.a) **CRISTIANE RODRIGUES LOPES BUCH**, ESCRIVENTE, lavrei, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu (a.a), **ERIKA MOREIRA DE ARAÚJO**, Tabeliã Substituta, dou fé e assino. **ERIKA MOREIRA DE ARAÚJO**, **LUCIANO NEVES GARCIA**, **NADA MAIS**. Traslada em seguida. Eu, **CRISTIANE RODRIGUES LOPES BUCH**, ESCRIVENTE, a extraí, conferi dou fé e assino, em público e raso.



Selo TJDF 20180400353082UGWH
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br

5º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

25 de Julho de 2018

LAYSE AMANDA DOS REIS CANUTO - ESCRIVENTE
Selo: TJDF 201804003554048EW
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

EM TESTEMUNHO

DA VERDADE

CRISTIANE RODRIGUES LOPES BUCH
ESCRIVENTE



5 OFICIO DE NOTAS R CIVIL E PROT - DF
 AUTENTICO, para os devidos efeitos, a
 presente fotocópia, que é reprodução fiel
 do documento que me foi apresentado, nos
 termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994,
 13 de Agosto de 2018

ELZILENE LENOS C. FARIAS-ESCREVENTE
 Selo: TJDFT20180400388824NZZZ
 Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140701001-8

Nome
 ANDRE VIEIRA PACHECO ROCHA

Filiação
 MARCIO ROCHA
 LAUDIENE VIEIRA PACHECO ROCHA

C.P.F. 062.882.926-48 **Documento de Identidade** MG13622458 SSPMG **Tipo Sang.**

Nascimento 29/07/1985 **Naturalidade** CAPIM DO PARANAIBA **UF** MG **Nacionalidade** BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-MG **Emissão** 19/01/2011 **Data de Registro** 02/04/2009

Ass. Presidente *[Assinatura]* **Registro no Crea** MG0000112441D

Valida em todo o Território Nacional

Titulo Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional *[Assinatura]* **0008501121**

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

OFÍCIO NOTARIAL DE REGISTROS
 OFÍCIO DE NOTAS R CIVIL E PROT - DF
 TITULAR
 Valdênia Soares Lima
 ESCRIVENTE

[Assinaturas manuscritas]
